

MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 16-12-2025 09:57
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0014450 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 110. OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
DESTINO 100. DESPACHO DEL MINISTRO / PATRICIA DUQUE CRUZ
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CGR - CORTE 30 DE NOVIEMBRE
OBS

PARA: PATRICIA DUQUE CRUZ
Ministra del Deporte

2025IE0014450



DE: 110.-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Noviembre de 2025

Atento Saludo Señora Ministra.

La Oficina de Control Interno, acorde al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Nacional 403 de 2020, el rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al Decreto Nacional 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k) y en cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No.03 de 2012, Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – *Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas* y Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024, por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, remite para su conocimiento y fines que estime “Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Noviembre de 2025”.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 – Artículo 16, Parágrafo 1, se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.


Cordialmente,

Firmado electrónicamente por:
OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ (osmartinez)
Jefe De Oficina De Control Interno
16-12-2025 09:57
7247b614abb75e14231ad58ed5ea32e5



Anexos: Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de Noviembre de 2025

Copia: Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de noviembre de 2025

Objetivo(s): Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR).

Alcance: Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR – Corte 30 de noviembre de 2025.

Marco Normativo:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025 V2


Limitantes: Falta de recurso humano en la Oficina de Control Interno, para efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento y a su vez acompañamiento a los procesos para asesoría de estos.

2. METODOLOGÍA:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 30 de noviembre de 2025.

2.1 Conformación, resultados, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento CGR a 30 de noviembre de 2025:

Conforme a la presentación del informe final de Auditoría Financiera (CGR)– Vigencia 2024, efectuada al Ministerio del Deporte, comunicada con Radicado externo 2025EE0119789 de fecha 17/06/2024 y Radicado Interno No. 2025ER0018049 y, su socialización en Comité institucional de Coordinación de Control Interno en sesión extraordinaria del 19/06/2025, se efectuó la formulación de (9) nueve planes de mejoramiento, correspondiente a las novedades presentadas por el ente de control, las cuales fueron informadas a la CGR a través del aplicativo SIRECI con fecha del 31/07/2025.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

A continuación, se presenta el estado del plan de mejoramiento del Ministerio, con relación a la inclusión de todas las novedades presentadas por el ente de control y conforme a los cierres presentados durante el periodo, así:

Tabla No. 1 Distribución hallazgos por vigencia, cumplidos, en ejecución y vencidos

Vigencia	Total Hallazgos	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en ejecución	Hallazgos en ejecución vencidos
2012-2015	129	129	0	0
2016	58	58	0	0
2019	259	238	21	0
2020	13	10	3	0
2022	23	10	13	0
2023	20	9	11	0
2024	26	12	114	0
2025	14	2	12	0
TOTAL	542	468	<u>74</u>	0

Fuente: Base de datos OCI E Isolucion – Corte 30/11/2025

Tabla No. 2 Distribución hallazgos en ejecución por proceso y vigencia.

PROCESO	VIGENCIA						Total
	2019	2020	2022	2023	2024	2025	
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	17	1	13	11	11	3	56
Adquisición de Bienes y Servicios	4	2			1		7
Gestión Jurídica						2	2
Fomento al Desarrollo Humano y Social					2	1	3
Direccionamiento Estratégico						2	2
Altos Logros						1	1
Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)						1	1
Gestión Financiera (GIT Tesorería)						1	1
Evaluación Independiente y Mejora Continua						1	1
Total	21	3	13	11	14	12	<u>74</u>

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion – Corte 30/11/2025


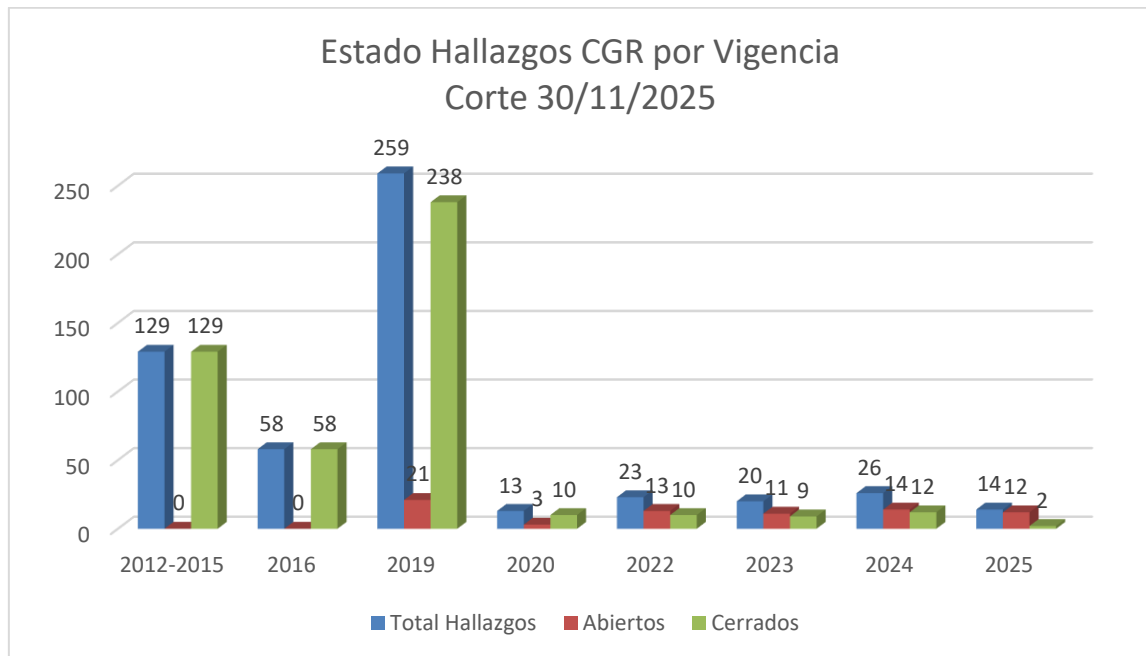
	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Tabla No. 3 Distribución Total hallazgos, abiertos, cerrados y % de avance

Estado	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	14	542
Abiertos	0	0	21	3	13	11	14	12	74
Cerrados	129	58	238	10	10	9	12	2	468
% de Avance	100%	100%	92%	77%	43%	45%	46%	14%	86,35%

Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 30/11/2025




Fuente: Base de datos OCI e Isolucion– Corte 30/11/2025


Tabla No. 4 Hallazgos cerrados durante el periodo

Durante el mes de noviembre se presentó el cierre de 10 planes de mejoramiento, de los cuales corresponden 8 (ocho) al proceso de Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica y, dos (2) al Proceso de Gestion Jurídica. A continuación, se presenta la relación de los 10 PM cerrados, la descripción del hallazgo y radicado con el cual se emitió el respectivo concepto por parte de la OCI:

#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripción	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Radicado Concepto de Cierre
1	H-8-2023	2023	1418	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	H-8. Convenio 1255 de 2022 Contrato No. LP-003-2022 Ariguaní-Magdalena (F-D), pago de cantidades no ejecutadas al 100% del contrato de obra No LP-003-2022 cuyo objeto es Remodelación y adecuación del parque paraíso en el municipio de Ariguaní – Magdalena" suscrito en el marco del	2025IE0012395

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripción	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Radicado Concepto de Cierre
					Convenio 1255 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el municipio de Ariguaní.	
2	H-8-2024	2024	1520	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Hallazgo No. 8. Calidad de Obra en el estadio de softbol Clemencia Bolívar. (F y D) En el contrato de obra LP-001-2022 entre el Municipio de Clemencia Bolívar y el Consorcio Bolívar 2022 para la construcción del estadio de softbol, se encontraron deficiencias en los procesos constructivos por \$60.955.938 y obras pagadas y no ejecutadas por \$22.851.194	
3	H-8-2022	2022	1269	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	H-8 Cantidades de obra escenario deportivo de Entreríos (A-D-IP) En el COI-1135-2017 se evidenció que no se respetaron las condiciones iniciales del diseño y la impermeabilización presenta filtraciones de agua. En el COI-1132-2017 se evidenció filtraciones en las cubiertas y las riostras no presentaban la distribución contemplada en los planos iniciales.	
5	H-16-2022	2022	1277	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	H-16. Mayor valor pagado en el COI-999-2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F). Revisada el acta de entrega se evidencia el pago del ítem de demarcación que estaba incluido en el ítem de grama sintética y un reporte de valor total de ajustes que corresponde a obra no ejecutada sin detalle, ni soportes que suma un valor de \$18.463.504.	2025IE0012779
4	H-14-2024	2024	1524	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Hallazgo No. 14 Estado de la grama sintética Convenio 1274 de 2020 Municipio de Garzón, Huila (F, D) En el convenio 1274 de 2020 y su contrato derivado 317 de 2021 para la construcción de cancha sintética de futbol en la Zona Urbana del Municipio de Garzón, se evidenció deterioro prematuro de la grama sintética, debido a la falta de mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo	
6	H-26-2023	2023	1469	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	H-26-AF-TUMACO: Planeación de la actividad contractual a cargo del Municipio de Tumaco contrato No. 003-21.(D) Conv. 1254-20, Se evidencio no cumplimiento de obligaciones de la planeación contractual del proyecto por parte del Municipio de Tumaco, no se contemplaron cimentaciones de graderías ni la malla de cerramiento, lo que se tradujo en la adición de más \$319 millones.	2025IE0012780

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripción	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Radicado Concepto de Cierre
7	H-6-2024	2024	1506	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	Hallazgo 6. Pagos de actividades de obra no ejecutada en los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 de 2023 (D, P, F). Cantidades de obras pagadas sin haber sido ejecutadas, para los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 de 2023, suscritos por el Ministerio del Deporte y Municipios de Sopo, Bahía Solano y Consacá.	
8	H-10-2024	2024	1510	Gestión Jurídica	Hallazgo 10. Debilidades en la recuperación de cartera a través de los procesos de cobro coactivo (D). Revisados los procesos de cobro coactivo a 31 de diciembre de 2023, la CGR identificó una cartera por recuperar de \$18.591.601.155 evidenciando procesos inactivos desde la vigencia 2022. Se evidencia que el Ministerio del Deporte no da impulso a los procesos de cobro coactivo.	2025IE0013052
9	H-11-2024	2024	1511	Gestión Jurídica	Hallazgo 11. Debilidad en la recuperación de cartera del convenio interadministrativo 761 de 2014 (D). El convenio interadministrativo 761 de 2014, liquidado unilateralmente el 10 de diciembre de 2019 mediante el acto administrativo 2401, ordenó el reintegro de \$1.570.014.700. A pesar de haber transcurrido casi 4 años, hasta el 31/12/2023, no se ha iniciado el proceso de cobro coactivo	2025IE0013187
10	H-15-2022	2022	1276	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	H-15. Obras ejecutadas en desarrollo del COI-987-2017 para construcción de escenario deportivo de Santo Domingo (A-F-D). Las obras de este proyecto quedaron inconclusas con un avance físico del 89,6% y financiero del 58,8%, los trabajos efectuados presentan daños, deterioro y/o contaminación del material filtrante y grama instalada, sin que la inversión realizada esté prestando servicio.	2025IE0013639


Fuente: Construcción Oficina de Control Interno – Aplicativo GESDOC

Conforme a lo anteriormente expuesto, a corte 30 de noviembre se presenta un cumplimiento del 100%, puesto que no se presentaron vencimientos de términos de los planes de mejora formulados.

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte presenta un avance del 86,35% conforme a lo consultado y verificado en la Herramienta Isolucion y la Base de datos de la OCI.

% Cumplimiento	% Avance
100%	86,35%

Para el mes de diciembre se tiene programado el cierre de once (12) PM correspondientes a los hallazgos distribuidos por proceso, así:

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


- Adquisición de Bienes y Servicios (7): 715/2019 – 745/2019 – 835/2019 – 888/2019 – 1073/2020 – 1074/2020 – 1515/2024.
- Fomento al Desarrollo Humano y Social (2): 1508/2024 – 1516/2024
- Gestion Financiera (1): 275/2025
- Altos Logros (1): 273/2025
- Gestion Jurídica (1): 281/2025

3. RESULTADOS:


A continuación, se relacionan los hallazgos que se encuentran en ejecución por vigencia, su estado y responsable del mismo, junto con su incidencia establecida por el ente de control:

VIGENCIA 2019 (21)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-19	705	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Disciplinario	H-19. Mantenimiento de la Infraestructura Deportiva (D): Convenio N° 843/2013 - Contrato de Obra N° 15/2014: "Adecuación y Reconstrucción del Polideportivo Villa Olímpica del municipio de Sabanalarga - Departamento del Atlántico-", se evidencio falta de Mantenimiento a la Infraestructura deportiva.
2	H-29	715	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2025	Administrativa Disciplinario	H-29. Revisado el Portal SECOP, se evidenció que las administraciones Municipales de Córdoba, El Guamo, Magangué, Margarita, San Estanislao, San Ferdo, San Juan Nepomuceno, Soplaviento, Turbaco, Villanueva, Inder Cartagena y la Gob. Bolívar solo realizaron la publicación del proceso en algunos documentos quedando pendientes de publicar algunas etapas especialmente la post contractual.
3	H-58	745	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2025	Administrativa	H-58. Devolución de Rendimientos Financieros (BA): Conv N° 1080/2017, a febrero de 2019, se observa en la cuenta bancaria abierta para el manejo de los recursos girados por Coldeportes, rendimientos financieros por \$1.266.501,13, generados desde enero de 2018, no devueltos o reintegrados a Coldeportes - Tesoro Nacional.

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
4	H-88	773	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-88. Publicación en el SECOP, contrato de interventoría N° 210/2018. Condoto: Se debe tener en cuenta la Circular N° 1/2013, suscrita por Colombia Compra Eficiente. Se observa que COLDEPORTES omitió la publicación del contrato de interventoría N° 210/2018, ya que no publicó en el SECOP, ninguno de los documentos del proceso de contratación.
5	H-92	777	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-92. Reintegro recursos no ejecutados. Se observó que el Conv N° 427/2015, fue suscrito por \$3.769.198.781, cifra esta que fue girada en su totalidad a la cuenta N° 578-542482 del Banco Bogotá y la Gob. del Chocó suscribió contratos para la ejecución del convenio por \$3.768.720.637, presentándose una diferencia de \$478.144 que no han sido reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional.
6	H-134	819	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-134. Cantidades de obra del contrato N° 205-2013 - La Calera (D, F). La CGR, en compañía de un funcionario de la Secretaría de Obras del Mpio realizó verificación de las cantidades ejecutadas por el contratista, se evidenciaron diferencias que se traducen en obra no ejecutada, pero si cancelada al contratista de obra: por valor de \$41,513,449,58
7	H-143	828	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-143. Ejecución Contrato Obra N° 123 de 2018 derivado Convenio Interadministrativo 977 de 2017 - Municipio de Tocaima (D). La CGR realizó visita fiscal al Mpio de Tocaima el 23/04/2019, donde se evidenció que en el sitio donde se desarrollará la obra no ha habido intervención y el contrato se encontraba suspendido hace 11 meses. Conv. suscrito el 3/11/2017, por \$1.729.160.755.
8	H-148	833	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-148. Ejecución Contractual por fuera de la Vigencia de los Convenios (D). Convenios 648, 666, 667, 674, 675, 769

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
							de 2014. Mediante oficios INDERHUILA solicita a Coldeportes ampliación del plazo de los convenios. Como respuesta a la anterior solicitud, Coldeportes manifiesta que no se requiere una nueva ampliación y mediante Resoluciones, liquida unilateralmente los Convenios.
9	H-150	835	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2025	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-150. Liquidación de Conv (F,D) El plazo de 30 meses para liquidar el convenio feneció el día 20/09/2018, sin que se hubiese realizado la liquidación administrativa o judicial, como bien lo reconoció COLDEPORTES en la comunic. 2018EE0021754. En cumplimiento de la obligación que le asiste a la Entidad se determinó saldo a favor de COLDEPORTES por \$66.264.003,45 Conv 674/2014.
10	H-165	850	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-165. Incumplimiento de los deberes contractuales derivados de la suscripción del convenio 337 del 26/06/2014 (D): Se liquidó unilateralmente el Convenio mediante Resol 1752/2017. De conformidad con lo indicado, se tiene que, los inconvenientes judiciales que se han presentado por desconocimiento de la norma por parte de los supervisores tanto de convenio como de contrato.
11	H-168	853	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-168. Estructura metálica en placas de concreto (D,F): Conv. San Pablo 669/2014, Construcción Polideportivo Vereda El Mesón. Si bien en términos generales la estructura metálica y cubierta están ancladas en sus columnas de concreto correspondientes, las uniones soldadas entre estructura metálica y platina de la columna de concreto, no son uniformes, la geometría es diferente.
12	H-169	854	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-169. Estabilidad del estadio Mpal (D,F). Se concluye que la estructura norte de las graderías presenta asentamientos por encima de

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
							los límites establecidos por la norma colombiana de construcciones sismorresistentes además que se evidencia el colapso de elementos no estructurales y se ha contabilizado en acta final obras no ejecutadas; y por ello se eleva a faltante \$154.834.702.
13	H-170	855	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario OI	H-170. Pagos a la seguridad social en salud y pensión. (D-OI). En la revisión efectuada a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los <municipios de Chinácota, Pamplonita, Puerto Santander, y Gramalote, se evidencio el pago de los apostes al SGSSS por debajo de lo ordenado en la normatividad vigente.
14	H-185	870	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-185. Gradería Cancha Gaitán mpio de Quimbaya Contr. 004-2018-Conv. 1331-2017 (D). En la visita de obra se evidenciaron deficiencias constructivas y defectos estructurales y de calidad en la estructura de concreto de las graderías del escenario, hormigueros, falta de recubrimiento mínimo en concreto vigas de la gradería e incorrecta conformación del confinamiento de vigas y columnas.
15	H-203	888	Adquisición de Bienes y Servicios	1/11/2019	31/12/2025	Administrativa	H- 203. Saldo cta. bancaria Conv. 726/2014, Barrancabermeja-Stander (A): El mpio abrió la cta. bancaria, Coldeportes desembolso a dicha cta. para los contrs. 1719-15 obra y 1724-15 intervent. y cuya ejecución financiera generó un saldo a favor de del mpio. De dicho saldo le corresponde a Coldeportes \$41.963.930,86. Se evidencia un valor mayor \$77.248.318,79 en el saldo de la Cta. Banc.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
16	H-226	911	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-226. Publicidad y registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. (D). Los municipios de Lérica, Alvarado, Ibagué, Líbano, y Purificación suscribieron convenios con Coldeportes, verificada la información de los Contratos derivados se evidencia que no se realizó la publicación de toda la documentación requerida y alguna se publicó de forma extemporánea.
17	H-230	915	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-230. Public. y registro en SECOP (D). Los municipios Dolores, Prado, Ataco, Anzoátegui, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, El Guamo, Herveo, Murillo, Palocabildo, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Venadillo, suscribieron conv. con Coldeportes, verificada la inf. de los Contr. deriv. se evidencia que no se publicó toda la documentación requerida y alguna forma extemp.
18	H-240	925	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa	H-240. Estado de la obra. Conv. Interadmin. 1233/2017. Contr. 109/2018 Construc. Cancha de microfútbol en grama sintética, Barrio Alemán. El Mpio de Lérica Tolima, Se presentan inconsistencias: La grama sintética instalada, recibida formalmente presenta levantamiento en algunos sitios, carpintería metálica en oxidación. Se observa acabado irregular en los costados de las escaleras.
19	H-254	939	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-254. Impermeabilización coliseo Oscar Figueroa Cartago–Indervalle (D,F). En visita técnica realizada por la CGR a las obras del conv. 768/2016, contr. derivado 851/2017, se observó la construcción de una cuneta en concreto que no tiene la capacidad de evacuación suficiente, generando inundación. Se evidenció que las cubiertas en concreto presentan inconvenientes en el repello.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
20	H-255	940	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-255. Instalación domo cubierta tarima plazuela-Mpio Alcalá (D,F): En visita realizada por la CGR a las obras del conv. 692/2014, cont. derivado CO201504002/2015 y en revisión del acta final del 28/12/2015, se evidenció el pago del ítem NP19 "construc. domo (cubierta escalera)", el cual no se instaló de manera completa dejando un sector de las escaleras al descubierto,
21	H-257	942	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/11/2019	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-257. Fisuras gradería estadio mpal de Caicedonia. (D,F): En visita técnica realizada el 10/05/2019, por la CGR, a las obras del conv. 1048/2017, cont. derivado 64/2018, por \$271.148.851, verificando el acta final de fecha 24/06/2019, se evidencia que la actividad "repello en la gradería" presenta problemas por fisuramiento en las huellas y contrahuellas. Detrimento por \$34.537.048.

VIGENCIA 2020 (3)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-02-JN	1073	Adquisición de Bienes y Servicios	15/01/2021	31/12/2025	Administrativa	H-2. Liquidación Conv. Inter.(A). Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, a la fecha no se han liquidado y las obras ya fueron ejecutadas y entregadas. Hay mora en los últimos giros al Depto.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2	H-03-JN	1074	Adquisición de Bienes y Servicios	15/01/2021	31/12/2025	Administrativa	H-3. Liquidación Conv. Inter. Revisados los conv.Nº 19, 20, 21, 22, 154, 271, 272 y 273/19, para obras XXI Juegos Nacionales y V Paralímpicos Bolívar 2019, derivados del Conv. Inter. Marco Nº 15-19, suscritos entre Coldeportes (Mindeporte) y el Depto de Bolívar, El Depto a la fecha, no ha liquidado las obras ejecutadas y entregadas. Existe mora injustificada en pagos a los contratistas.
3	H-04-JN	1075	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15/01/2021	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Indagación preliminar	H-4. Rend. financieros y reintegros al Tesoro Nacional, conv. para XXI Juegos Nac. y V Parana. (D, IP). 1. Conv.22, 19, 154 y 272-19: Se evidenció la existencia de saldos en las cuentas bancarias, que no corresponden a la diferencia entre lo girado por el Ministerio y lo pagado por el Depto, no existen conciliaciones bancarias, no se registraron todos los pagos realizados a contratistas

VIGENCIA 2022 (13)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	AF-H2-2022	264	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/01/2023	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-2. Doc. Contractuales Plataforma SECOP (D). Ausencia de soportes documentales en SECOP, que dan cuenta de la ejecución de los contratos y/o convenios celebrados por Mindeporte, situación contraria a lo indicado en los Dec. 1081 y 1082 de 2015. Revisada la información suministrada por Mindeporte, se evidencia ausencia de documentación en la etapa de ejecución publicado en SECOP.

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
2	AF-H4-2022	266	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	1/01/2023	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-4 Pérdida de competencia para liquidación de contratos (D). Se evidenció que 24 contratos que no han sido liquidados de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 1150 de 2011, presentándose pérdida de competencia por parte de Mindeporte para liquidarlos. En la información entregada, se observaron 96 contratos Vig. del 2012 al 2018, con "Pérdida de competencia para liquidar".
3	H-1-2022	1262	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-1. Cumplimiento obligaciones interventoría y supervisión para proyectos de escenarios deportivos (A-D). Las actas de entrega y recibo de la interventoría presentan diferencias en la fechas respecto a las actas de obra finales pagadas al contratista de obra, ya que se elaboraron de forma posterior a la finalización del servicio de interventoría.
4	H-2-2022	1263	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-2. Valores pagados en contrato interadministrativo 381 de 2017 vs. ejecución de obra (D - F). Se evidencia en la documentación y los respectivos soportes, mayores valores pagados en 22 escenarios deportivos por INDEPORTES a VIVA, a los realmente ejecutados en los contratos de obra de los diferentes proveedores contratados por VIVA, en un valor de \$3.985.918.023.
5	H-3-2022	1264	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-3. Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D). Múltiples inconsistencias documentales, contractuales y financieras en cada uno de los documentos presentados por las entidades, bajo un mismo objeto contractual.

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
6	H-4-2022	1265	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-4. Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata(A-D-F) La CGR en visita el 28/03/2022 revisó el acta de entrega y recibo final firmada el 22/08/2022, evidenciando que se presentó mayores cantidades pagadas a las realmente ejecutadas en 14 ítems y en 2 ítems se describe la necesidad pero no cumple con las condiciones contratadas.
7	H-5-2022	1266	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa OI Disciplinario	H-5. Sistemas de información, documentación y archivo (A-D-OI). En los municipios de Nechí, Entreríos y Angelópolis, no reposan los manuales de mantenimiento ni el acta de reunión de socialización de los manuales, el acta de entrega del escenario deportivo a los alcaldes y las secretarías responsables.
8	H-6-2022	1267	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-6. Obras ejecutadas del COI-980-2017 municipio de Guadalupe (A-D-F). En evaluación documental realizada a los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, administrativos, se establece que a la fecha la obra no se encuentra en funcionamiento y no es posible garantizar la calidad y estabilidad de las ejecuciones; es decir, no se cumplió con el objetivo para el cual fue destinado.
9	H-7-2022	1268	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	H-7. Deterioro y funcionamiento de equipos en el escenario deportivo 20 de enero del municipio de Nechí (A-D). Se evidencia deterioro, no funcionamiento, daño y pérdida de elementos entregados y que hoy para la comunidad no presta un servicio o lo hace de manera parcial.


	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
10	H-10-2022	1271	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-10 Estado actual de las obras, mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, COI 992-2017 Municipio de Cañasgordas. (A-D-F). Se evidenció deslizamiento de tierra asociado al colapso de muro existente, funcionamiento ineficiente de filtros y drenajes que generan encharcamiento, evento que generó afectaciones parciales y/o totales a algunas de las actividades ejecutadas.
11	H-11-2022	1272	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H 11. Mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, COI-988/2017 Municipio de Cocorná (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 2.1,3.1, 3.2,3.3,4.3, y OE 11 un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 10-12-2019, con las mediciones y apreciaciones generadas en campo por la CGR.
12	H-12-2022	1273	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-12. Mayores valores pagados y funcionalidad de las ejecuciones, en desarrollo del COI-978-2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Carlos (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 2.6, 2.16, 2.24, 2.25, 2.30 y 4.4, un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final.
13	H-13-2022	1274	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	18/07/2022	15/02/2026	Administrativa Disciplinario Fiscal	H-13. Mayores valores pagados, cumplimiento de especificaciones técnicas y funcionalidad del COI-993-2017 Municipio de Guatapé (A-D-F). Se evidenció con relación a los ítems: 4.15, 4.17, 10.6, 12.9,13.3,13.7, 13.12,13.19,13.2, 13.21,14.2, OE34, OE72 y OE85 un mayor valor pagado respecto al ejecutado, al comparar el acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 06/03/2020.


	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

VIGENCIA 2023 (11)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-28-2023	1408	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15/08/2023	15/02/2026	Administrativa Disciplinario	HALLAZGO N° 28. Obras físicas sin iniciar por ajustes requeridos en diseños y recursos adicionales para cierre financiero del Convenio COID-1076-2021 y Contrato de obra 362 de 2021. Apartadó.(D) En desarrollo del convenio 1076-2021 y contrato de interventoría 3-1-102452-COI-1364-01, se realizó la revisión de estudios y diseños realizándose varias observaciones a ser subsanadas.
2	H-4-2023	1414	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Administrativa	H-4 Saldos por utilizar de reservas constituidas al cierre de 2021, El hallazgo se relaciona con debilidades de seguimiento y control de los supervisores de contratos y convenios, sobre la ejecución de las reservas presupuestales constituidas al cierre de 2021.
3	H-5-2023	1415	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Indagación Preliminar	H-5 Convenio Interadministrativo No. 1259-2021 y contrato de obra No. 70678-OC-001-2022 Municipio San Benito de Abad (IP), incumplimiento de la cláusula 8.1 del convenio interadministrativo No. 1259 de 2021, correspondiente a las obligaciones a cargo del Ente Ejecutor, puntualmente en el recibo y manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio del Deporte.
4	H-6-2023	1416	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Fiscal Disciplinario	H-6. Convenio 1238 de 2020-Contrato de Obra No. 052 de 2021 San José de Miranda-Santander. (F – D), incumplimiento en las cláusulas contractuales del contrato de obra No 052 de 2021, suscrito entre el municipio de San José de Miranda y el “Consortio Estadio Deportivo 2021” para la realización del proyecto denominado “Mejoramiento Ampliación de los Espacios para el Disfrute Recreativo del Estadio Deportivo”.

	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
5	H-7-2023	1417	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Fiscal Disciplinario	H-7. Convenio 1240 de 2020 Contrato No. LP-SIM-010-2021 Montería Córdoba. (F-D), pago de cantidades de obra no ejecutadas al 100% del contrato de obra No LP-SIM-010-2021 cuyo objeto es "Construcción de la unidad recreo deportiva de occidente en el municipio de Montería" suscrito en el marco del Convenio 1240 de 2020 celebrado entre el Ministerio del Deporte y el municipio de Montería
6	H-9-2023	1419	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Disciplinario	H-9 Traslado Oportuno de Rendimientos financieros a la Nación (D), se detectaron debilidades en el ejercicio de la supervisión contractual, relacionada con la exigencia del cumplimiento de la obligación relacionada con el reintegro oportuno de los rendimientos financieros generados en algunos convenios interadministrativos suscritos por el Ministerio.
7	H-11-2023	1420	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	11/08/2023	15/02/2026	Disciplinario	H-11 Contrato de consultoría No. 1250 de 2020. Interventoría de Obra Coliseo Mayor de Ibagué (D) Al analizar la ejecución del contrato de consultoría No. 1250 de 2020 cuyo objeto es la interventoría de Obra del Coliseo Mayor de Ibagué, se evidenció que el Ministerio del Deporte, realizó pagos por concepto de costos variables que excedieron el porcentaje establecido en la forma de pago que correspondía hasta el 60% del valor total del contrato, sujeto al avance de obra. Situación observada para los pagos séptimo y octavo realizados en 2021 y para el pago noveno realizado en la vigencia 2022. Sin embargo, la entidad argumentó que, con los pagos posteriores, realizó los ajustes para normalizar las condiciones establecidas en el contrato para los costos variables.
8	H-24-2023	1470	Apoyo en Infraestructura	22/01/2024	15/02/2026	Disciplinario Fiscal	H-24-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Diferencias en

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			ra Técnica y Científica				precios unitarios del contrato 1-2022 construcción Velódromo. Mpio Mosquera (D, F). En el presupuesto oficial del contrato 1-2022 se incluyeron precios unitarios diferentes para actividades iguales, generando detrimento al patrimonio público por \$551.768.058. Actividades iguales constatadas a nivel de especificaciones y análisis de precios.
9	H-25-2023	1471	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/01/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario	H-25-AC-FUSAGASUGA-MOSQUERA: Placas entre piso concreto contrato 1-22 construcción velódromo Mpio Mosquera (D). En el contrato 1-22 construcción Velódromo, se evidenció cambio de la especificación de la resistencia del concreto de placas de entre piso graderías. La modificación, afectó lo autorizado en la licencia de construcción y no fue informado oportunamente a la entidad encargada.
10	H-14-2023	1472	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/01/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario Fiscal	H-14-AC-G: GUAVIARE: Equipo fotovoltaico. Mantenimiento Cont. 046-2018 Parque Recreo Deportivo Bello Horizonte (F, D) En el Cont. 046-2018 el "Ítem 86: ENERGÍA FOTOVOLTAICA", no está funcionando, presentando descarga en las baterías que recibe la energía de los paneles solares y deterioro de las conexiones eléctricas; generando detrimento por \$455.656.555. Gradas con humedad y vegetación
11	H-15-2023	1473	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	22/01/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario Fiscal	H-15-AC-G: GUAVIARE: Calidad de obra. Contrato 046-2018, Parque Recreo Deportivo Bello Horizonte (F, D). En el contrato 046-2018, el ítem 18.01: cubierta, no se instaló correctamente y los materiales utilizados no cumplieron con las condiciones de calidad, afectando la durabilidad y garantía de los ítems 22:

 Deporte	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
							pañete y 25: pintura. Generando detrimento al patrimonio público por \$52.669.802

VIGENCIA 2024 (14)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	H-12-2024	1500	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	30/07/2024	15/02/2026	Disciplinario Penal Fiscal OI	Contrato No. 100 de 2021 - Uso del suelo predio Complejo Deportivo sector de La Meseta del municipio de Girón (D-P-F-OI) Practicada la visita a la obra en ejecución del Contrato No. 100 de 2021 en el municipio de Girón se evidenció que, el predio donde se viene adelantando el proyecto de inversión pública, no cumple los requisitos legales esenciales
2	H-5-2024	1505	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario Fiscal	Hallazgo 5. Calidad de la obra derivada del convenio interadministrativo 1329 de 2017, Municipio de Villeta, Cundinamarca (D, F). Se evidenció el pago de obra, en el marco del convenio interadministrativo 1329 de 2017, con daños prematuros, atribuibles a falencias en los procesos constructivos implementados por el 6contratista de obra en el Patinódromo construido en el Mcpio de Villeta
3	H-8-2024	1508	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29/07/2024	31/12/2025 Radicado No. 2025IE0011346	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 8. Pago de pasivos exigibles - Vigencia expirada (D). La situación se centra en el pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas por \$76.831.659.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
4	H-9-2024	1509	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Indagación Preliminar	Pérdida de competencia para liquidación de contratos vigencias anteriores (IP). El Ministerio del Deporte perdió la competencia para liquidar 111 contratos al finalizar el año 2023, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. De estos, 22 contratos con saldo a favor del Ministerio, evidenciando ineficiencias en los procesos de liquidación.
5	H-13-2024	1513	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo	Hallazgo 13. Viabilidad y planeación de convenios interadministrativos para infraestructura deportiva. Luego de la revisión documental y en sitio de las obras derivadas de los convenios interadministrativos para el desarrollo de infraestructura deportiva en diferentes territorios, evidencia debilidad en el proceso de viabilidad técnica, financiera y administrativa
6	H-15-2024	1515	Adquisición de Bienes y Servicios	29/07/2024	31/12/2025	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo 15. Debilidades en la supervisión en contratos de prestación de servicios (D, F). La CGR determina debilidades en la supervisión y ejecución de 17 contratos de prestación de servicios, objeto de la denuncia 292714- 82111-SE. Existe ausencia de algunos soportes de los pagos y los soportes existentes no permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas
7	H-16-2024	1516	Fomento al Desarrollo Humano y Social	29/07/2024	31/12/2025 Radicado No. 2025IE0011346	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo 16. Incumplimiento del Contrato Interadministrativo 1215 de 2023 por parte de ENTERRITORIO (D, F). Se evidencia incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023, por parte del contratista EnTerritorio, específicamente en la ejecución del primer pago por \$25.874.521.747 desembolsado por el Ministerio del Deporte al no

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
							legalizar la documentación que soporta su ejecución
8	H-22-2024	1517	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Beneficio de Auditoría	Hallazgo No. 22. Calidad de Obra Convenio COID-1268-2021, unidad Deportiva Ivan Duque Escobar, Gomez Plata (BA). En el contrato SAMC003-2022, derivado del convenio COID-1268-2021, se identificaron problemas de planeación y calidad de obra en la adecuación y remodelación de la Unidad Deportiva Iván Duque Escobar de Gómez Plata, Antioquia por \$148.410.380.
9	H-23-2024	1518	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario	H 23. Planeación y estructuración de estudios y diseños y recursos adicionales del convenio COID-1076 2021 y contrato de obra 362 de 2021. Apartadó. (D). En desarrollo del convenio 1076-2021, se realizó la revisión de estudios y diseños del proyecto de construcción primera etapa del centro de alto rendimiento deportivo regional de Apartadó, con varias observaciones sobre los componentes estructural, geotécnico y arquitectónico, a ser subsanadas, lo que ocasionó la necesidad de recursos adicionales y la suspensión de la etapa 2 del proyecto y de la ejecución física de las obras.
10	H-24-2024	1519	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Indagación Preliminar	H 24. Planeación, Calidad y Funcionalidad Convenio COID-1223 2021. Complejo Deportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támesis (IP) En el contrato SPDT-SA-MC-006 2022, derivado del convenio COID-1223-2021 se identificaron deficiencias de planeación, funcionalidad y calidad en las obras de construcción, adecuación y remodelación del Complejo Polideportivo Rafael J. Mejía del Municipio de Támesis-Antioquia.


	PROCESO		Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO		Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
11	H-9-2024	1521	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo No. 9 Cantidades de obra pagos sin ejecución Córdoba Bolívar. (F y D) En el contrato de obra LP-001-2021 entre el Municipio de Córdoba, Bolívar y el Consorcio P&E San Martín para la construcción del estadio de fútbol San Martín, se evidenció un pago por obra no ejecutada.
12	H-10-2024	1522	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo No. 10 Puesta en funcionamiento escenario recreo deportivo cancha fútbol 11, Municipio de Mahates (D) El proyecto Recreo deportivo Cancha de fútbol de San Basilio de Palenque a 7 meses de su entrega (24 de agosto de 2023), aún no se encuentra en funcionamiento, toda vez que, está pendiente el suministro e instalación de la grama.
13	H-11-2024	1523	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo No. 11. Pago de obra no ejecutada, escenario recreo deportivo cancha fútbol 11. Mahates, Bolívar (F,D) En el contrato 466 de 2023 por \$3.473.536.709 suscrito por el IDER para Obras de Mantenimiento y Mejoramiento de Escenarios Deportivos, se suscribió acta con saldos pendientes por terminar por \$173.676.835, con fecha final de entrega el 15 de enero de 2024
14	H-10-2024	1525	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	29/07/2024	15/02/2026	Administrativo Fiscal Disciplinario	Hallazgo No. 10. Calidad de acabados Contrato LP-001-2021 (D, F) El Contrato de obra No LP-001-2021 por \$4.155.490.413 (Recursos Nacionales – MEN y Recursos Propios) presenta manchas negras impregnadas en la pintura de toda la estructura, afectando su acabado final e incumpliendo el ítem 3.06 además de lo establecido en las especificaciones técnicas y en los estudios previos


	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

VIGENCIA 2025 (12)


#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	AC-H3-24	273	Altos Logros	20/01/2025	30/12/2025 Radicado No. 2025IE0011011	Administrativo Indagación Preliminar	Hallazgo 3. COH_13032_2024-2-AU-CU Incertidumbre frente a la inversión de los gastos operativos CAIP-868-2023 Ministerio de Deporte y Comité Olímpico Colombiano (IP) Se constató que, se avalaron y pagaron los gastos operativos sin los soportes que respaldan su ejecución en el marco del contrato, para atender los compromisos adquiridos en este, generando incertidumbre sobre la ejecución de \$3.201.285.739.
2	AC-H4-24	270	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	05/01/2025	15/02/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 4 COH_12062_2024-2-AU-CU Inoportunidad en las interventorías derivadas del contrato interadministrativo 965 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Deporte y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca (D) Se identificaron incumplimientos de obligaciones contractuales y del plan operativo. La contratación de las interventorías tardó cerca de 6 meses desde la firma del contrato y la revisión de estudios se realizó en enero y febrero de 2023 a pesar de que estaban disponibles antes

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
3	D-H1-2025	274	Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica	15/05/2025	15/02/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo No. 1: La Contraloría General de la República (CGR), observó debilidades en la planeación de los convenios solidarios celebrados en virtud del proceso de la Convocatoria I de Iniciativas Comunales realizada por el Ministerio del Deporte, en la vigencia 2023, lo que generó retrasos en la ejecución de 113 convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal (OAC). (D)
4	AF-H1-25	275	Fomento al Desarrollo Humano y Social	01/07/2025	31/12/2025 Sesión No. 5 CICC	Administrativa	Hallazgo 1. Diferencias entre los soportes y el saldo de la subcuenta 190803 - Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos.
5	AF-H2-25	276	Gestión Jurídica	01/07/2025	31/03/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 2. Diferencias entre los soportes y el saldo de la cuenta 2514 - Beneficios posemplo
6	AF-H3-25	277	Gestión Financiera (GIT Gestión Contable)	01/07/2025	31/03/2026	Administrativa	Hallazgo 3. Diferencias en la información reportada por el Ministerio del Deporte a la Contaduría General de la Nación, por concepto de operaciones recíprocas a 31 de diciembre de 2024.
7	AF-H4-25	278	Direccionamiento Estratégico	01/07/2025	31/01/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 4. Reservas presupuestales con inadecuada justificación. Se identificó que reservas presupuestales por \$64.845.419.806 no están justificadas con los argumentos que permite la norma, por el contrario, están sustentadas en trámites inoportunos.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
8	AF-H5-25	279	Gestión Financiera (GIT Tesorería)	01/07/2025	31/01/2026	Administrativo	Hallazgo 5. PAC no utilizado 2024. El hallazgo hace referencia a la baja ejecución del PAC en la vigencia 2024.
9	AF-H6-25	280	Direccionamiento Estratégico	01/07/2025	31/01/2026	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 6. Baja ejecución presupuestal en la vigencia 2024. El Ministerio del Deporte presentó baja ejecución presupuestal en la vigencia 2024, la apropiación definitiva se estableció en \$1.058.666.759.556, de estos se obligaron \$381.372.518.600 equivalentes al 36,0%. Sumado a esto, se observó ausencia de celeridad para comprometer los recursos.
10	AF-H7-25	281	Gestión Jurídica	01/07/2025	En Verificación de la OCI Solicitud de Cierre Radicado No. 2025IE0013059	Administrativo Disciplinario Fiscal	Hallazgo 7. Se evidenciaron deficiencias para recuperar recursos que financiaron contratos interadministrativos; lo que ocasionó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y, por consiguiente, presunto detrimento patrimonial por \$438.572.384, dejando de recaudar dichos recursos.
11	AF-H8-25	282	Evaluación Independiente y Mejora Continua	01/07/2025	31/01/2026	Administrativa	Hallazgo 8. El Ministerio del Deporte reportó en el SIRECI 86 hallazgos con fecha de cumplimiento de actividades al 31/12/2024, de estos solo se dio cierre a 11, quedando 75 sin el cumplimiento de las actividades planteadas.

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

#	CÓDIGO HALLAZGO	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
12	AF-H9-25	283	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	01/07/2025	En Verificación de la OCI Solicitud de Cierre Radicado No. 2025IE0013351	Administrativo Disciplinario	Hallazgo 9. Mantenimiento Cancha El Cauchal. Conv. 1259-2021. San Benito de Abad, Sucre. Se evidenció falta de mantenimiento preventivo y recurrente por parte del ente ejecutor. Reflejando inobservancia de principios que rigen la función administrativa, como debilidad en el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, responsabilidad que recae en la entidad Territ.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS:

N/A

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO

N/A


6. CONCLUSION(ES):

El plan de Mejoramiento del Ministerio del Deporte, suscrito acorde a las novedades identificadas por el ente de control corresponde a un total de **542** hallazgos, de los cuales al corte 30/11/2025 se identificaron **468** cumplidos y **74** en ejecución, de los cuales se reportan en estado vencido **0** al corte del periodo.

Para el corte evaluado, se tiene un porcentaje de cumplimiento del **100%**, teniendo en cuenta las prórrogas solicitadas por los diferentes procesos a raíz de las mesas de trabajo efectuados con la oficina de control interno.

Para el corte evaluado, se presenta avance de ejecución del **86,35%**, correspondiente al cierre de 468 hallazgos, de un total de 542.

Con radicado No. 2025IE0013351 la Direccion de Herramientas solicitó a la OCI, la verificación del PM del Hallazgo 283/2025 para su cierre. Igualmente, la oficina jurídica con Radicado No. 2025IE0013059 solicitó la verificación del Plan de mejoramiento del hallazgo 281/2025, para su respectivo cierre. Con Radicado No.2025IE0012424 el proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios, solicitó la verificación del PM del hallazgo 745/2019

	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

para su cierre y con radicado No. 2025IE0012258 la dirección de Fomento solicito el cierre del PM para el Hallazgo 1516/2024.

7. RECOMENDACIÓN(ES) GENERAL(ES):

Se recomienda a todos los colaboradores del Ministerio, fortalecer y aplicar los conceptos de Autocontrol y Autoevaluación, Conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.21.2.2 Responsables. *“Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así... e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.*

En sintonía con lo anterior, se recomienda a todos los procesos de la Entidad, dar cumplimiento a las actividades planificadas por los mismos, en el tiempo y modo que determinaron, acorde a lo estipulado en la Circular Interna No 17 del 06/08/2025 con asunto: Cumplimiento y ejecución efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional

Presentar, de ser el caso en que aplique, las solicitudes (con argumentos) de ampliación o modificación a los planes de mejoramiento, con el objeto de poder efectuar su cierre de manera efectiva, evidenciando la subsanación de la causa raíz y que la misma no se haya vuelto a presentar posteriormente, acorde a las políticas internas del Ministerio.

Efectuar mesas de trabajo entre los Procesos y la Oficina de Control Interno del Ministerio, identificando brechas y proponiendo compromisos para la finalización de los planes de mejoramiento de manera eficaz.

Oficio Remisorio de GESDOC firmado Por:

Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez – Jefe Oficina de Control Interno
